

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
	اداره تنفيذ الطرق	
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي : الامير فواز
رقم المخطط : BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 04 عرض الشارع : 18
الى محطة رقم : 240.92+0
2nd LAYER SUB BASE : استلام الطبقة : 187.50+0

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : ☐ التاريخ : 30/11/2024

المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐

ملاحظات :
ملاحظات المراقبة :
جاهز ☒
غير جاهز ☐

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطة 187.50+0 الى المحطة : 240.92+0

من المحطة : الى المحطة :
مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري ☐

متطابق ☒
غير متطابق ☐

ملاحظات :
التوقيع : ☐ التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :
توقيع المساح : / /

نتيجة تدقيق المواد :
تصنيف المواد : مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي : مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

النتيجة : ☐ ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع : / / التاريخ : / /

ملاحظات : يجب إرفاق نتائج الاختبارات

تعليمات المهندس الاستشاري : موافق ☐ موافق ☐

تم الاستلام : مندوب المقاول : التوقيع : / / التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للإتصال : م.س.ر المصطفى : 0544714479 - الإدارة : 0566357166 - info@ramakcompany.com

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتفويض والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات			
تقرير إستلام طبقة ردم											
ROAD-B03-4		رقم الشارع :-		تلال الغروب		إسم المشروع :-					
240.92M		طول الشارع :-		BLOCK03		رقم المخطط :-					
18.000		عرض الشارع :-		2 ND LAYER SUB BASE		رقم الطبقة :-					
		WIDHT-R 9.000				LAYAER THICKNESS				0.150	
		WIDHT-L 9.000				DEOTH FROM TOP SUB.G				0.000	
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R	CL width from L		CL width from R	
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-2.00%				
				5.500	-3.000	0.000	3.000				
17	187.5	530243.0203	2369198.922	61.366	61.283	61.328	61.268	9.000		9.000	
18	200	530249.1436	2369209.453	61.449	61.366	61.411	61.351	9.000		9.000	
19	212.5	530260.5013	2369208.437	61.486	61.403	61.448	61.388	9.000		9.000	
20	225	530272.042	2369203.635	61.509	61.426	61.471	61.411	9.000		9.000	
21	237.5	530283.5827	2369198.833	61.532	61.449	61.494	61.434	9.000		9.000	
22	240.92	530286.7425	2369197.518	61.538	61.455	61.500	61.440	9.000		9.000	
الإستشاري								المقاول			
مكتب رمك للإستشارات الهندسية								شركة طرق الرياض للمقاولات			
الإسم :- م. / فاضل محمد								الإسم :-			
التوقيع :-								التوقيع :-			
التاريخ :-								التاريخ :-			



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ أعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.86
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	02-12-24
Location	جدة - حي الأمير فواز - مخطط تلال الغروب	Tested By	Abdullah
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Final Layer of Sub Base
Location	Block 03 Road 04 Sta. 0+187 to 0+240

[illegible]

M.D.D	=	2.241 kg/m ³
O.M.C	=	6.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

** These results are for the tested materials and tested locations only.*

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.


Checked by



Approved by



Room 372575 commercial Jeddah, license 142, Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylab.com www.proficiencylab.com Mob.: 0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

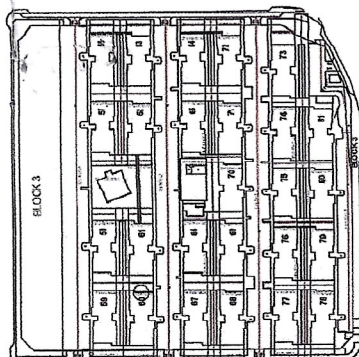

اتجاه صرف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
إمارة دبي
مجلس بلدية دبي
إدارة التخطيط العمراني

وزارة الإسكان

الشطرنج
شركة ساني العامة

شركة
سني العامة
Sani General Co.

المستشار العام
الاجنية للمشاورات الهندسية

المستشار
مكتب روك للاستشارات الهندسية

مكتب روك للاستشارات الهندسية
Rok Engineering & Consulting
Office for Engineering & Consulting
Rok Engineering & Consulting
Rok Engineering & Consulting

المقاول
شركة طريق الرياض للخدمات

شركة طريق الرياض للخدمات

تصاميم الطرق لمشروع طلال الفروب
بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

معلومات الإسناد والتصاميم

NO. 3 GENERAL LAYOUT PLAN 1:350

BLOCK 3

BLOCK 3



Plot Area = 62,213 m²
TOTAL BUILDUP AREA = 162,822 m²
557 PARKING SPACES
FAR = 2.81
